

N	Этапы	Вид элемента	Сроки			Ответственные	Связи	Готовность	Статус
			Начало	Окончание	Длит.				
1	Отмена Коттеджного рабства при поддержке Губернатора ЛО (Рабочий сетевой график), Прогнозная версия								
2	**Проект "Отмена КР" при поддержке Губернатора ЛО**	**Этап**	**19.06.2026**	**07.12.2027**	**373,00**			**2,16**	**Выполняется**
3	1-й дозвон сообщества пострадавших на Прямую линию Губернатора ЛО Дрозденко А.Ю.	Веха	19.06.2026	19.06.2026		Сообщество		100,00	Завершено
4	Проведен 1-й Круглый стол по КР	Веха	17.07.2026	17.07.2026		Вице-губернатор ЛО	3	100,00	Завершено
5	2-й дозвон сообщества пострадавших на Прямую линию Губернатора ЛО Дрозденко А.Ю.	Веха	05.10.2026	05.10.2026		Сообщество		100,00	Завершено
6	Проведен 2-й Круглый стол по КР (ОТМЕНЕН)	Веха	15.10.2026	15.10.2026		Губернатор ЛО	5	100,00	Завершено
7	Срок решения по Ленобласти продлен до 01.12.2026	Веха	15.10.2026	15.10.2026		Губернатор ЛО	6	100,00	Завершено
8	**Задача 1. Помощь текущим поселкам**	**Этап**	**17.07.2026**	**07.12.2027**	**353,00**			**1,88**	**Выполняется**
9	**Ленинградская область**	**Этап**	**17.07.2026**	**05.08.2027**	**266,00**			**2,01**	**Выполняется**
10	Целевой срок решения, установленный Губернатором ЛО	Веха	01.12.2026	01.12.2026		Губернатор ЛО			Запланировано
11	**Установление Публичного сервитута (ПС)**	**Этап**	**17.07.2026**	**10.12.2026**	**104,00**			**7,99**	**Выполняется**
12	**Установление ПС в 1-м поселке**	**Этап**	**17.07.2026**	**24.09.2026**	**50,00**			**100,00**	**Завершено**
13	Проработка ПС в 1-м поселке	Проектная задач	17.07.2026	24.09.2026	50,00	Жители поселка	4	100,00	Завершено
14	ПС в 1-м поселке установлен	Веха	24.09.2026	24.09.2026			13	100,00	Завершено
15	**Установление ПС в первых 8-ми пилотных поселках**	**Этап**	**17.07.2026**	**01.12.2026**	**96,00**			**10,00**	**Выполняется**
16	Проработка ПС в первых 8-ми пилотных поселках	Проектная задач	17.07.2026	22.10.2026	70,00	Прокуратура ЛО	4	10,00	Выполняется
17	ПС установлен в КП Norland	Веха	01.12.2026	01.12.2026			16		Запланировано
18	ПС установлен в КП Ал Парк	Веха	01.12.2026	01.12.2026			16		Запланировано
19	ПС установлен в КП БРУСНИКА ROAD	Веха	01.12.2026	01.12.2026			16		Запланировано
20	ПС установлен в КП Видовой	Веха	01.12.2026	01.12.2026			16		Запланировано
21	ПС установлен в КП Журавлиное	Веха	01.12.2026	01.12.2026			16		Запланировано
22	ПС установлен в КП Скотное	Веха	01.12.2026	01.12.2026			16		Запланировано
23	ПС установлен в Радужное	Веха	24.09.2026	24.09.2026		Администрация Всеволожско		100,00	Завершено
24	ПС установлен в Цвелодубово	Веха	01.12.2026	01.12.2026			16		Запланировано
25	ПС в 8-ми пилотных поселках установлен	Веха	01.12.2026	01.12.2026		Прокуратура ЛО	20;17;22;18;1		Запланировано
26	**Установление ПС во всех проблемных поселках ЛО**	**Этап**	**17.07.2026**	**10.12.2026**	**104,00**			**2,90**	**Выполняется**
27	Проработка ПС в проблемных поселках ЛО	Проектная задач	17.07.2026	14.10.2026	64,00	КУГИ	4	80,00	Выполняется
28	**Бокситогорский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**				**Запланировано**
29	**Проработка ПС в проблемных поселках Бокситогорского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**		**Запланировано**
30	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Бокситогорск	10ОО		Запланировано
31	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			30НН		Запланировано
32	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			31		Запланировано
33	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			32		Запланировано
34	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10		Запланировано
35	ПС установлен в проблемных поселках Бокситогорского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			34		Запланировано
36	**Волосовский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**10.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
37	**Проработка ПС в проблемных поселках Волосовского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**10.12.2026**	**40,00**		**27;6**		**Запланировано**
38	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	10.12.2026	40,00	Администрация Волосовского			Запланировано
39	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			38НН		Запланировано
40	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			39		Запланировано
41	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			40		Запланировано
42	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10		Запланировано
43	ПС установлен в проблемных поселках Волосовского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			42		Запланировано
44	**Волховский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**				**Запланировано**
45	**Проработка ПС в проблемных поселках Волховского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**		**Запланировано**
46	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Волховского			Запланировано
47	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			46НН		Запланировано
48	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			47		Запланировано
49	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			48		Запланировано
50	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10		Запланировано
51	ПС установлен в проблемных поселках Волховского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			50		Запланировано
52	**Всеволожский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**				**Запланировано**
53	**Проработка ПС в проблемных поселках Всеволожского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**		**Запланировано**
54	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Всеволожско			Запланировано
55	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			54НН		Запланировано
56	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			55		Запланировано
57	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			56		Запланировано
58	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10		Запланировано
59	ПС установлен в проблемных поселках Всеволожского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			58		Запланировано
60	**Выборгский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**				**Запланировано**
61	**Проработка ПС в проблемных поселках Выборгского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**		**Запланировано**
62	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Выборгского			Запланировано
63	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			62НН		Запланировано
64	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			63		Запланировано
65	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			64		Запланировано
66	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10		Запланировано
67	ПС установлен в проблемных поселках Выборгского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			66		Запланировано
68	**Гатчинский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**				**Запланировано**
69	**Проработка ПС в проблемных поселках Гатчинского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**		**Запланировано**
70	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Гатчинского р			Запланировано

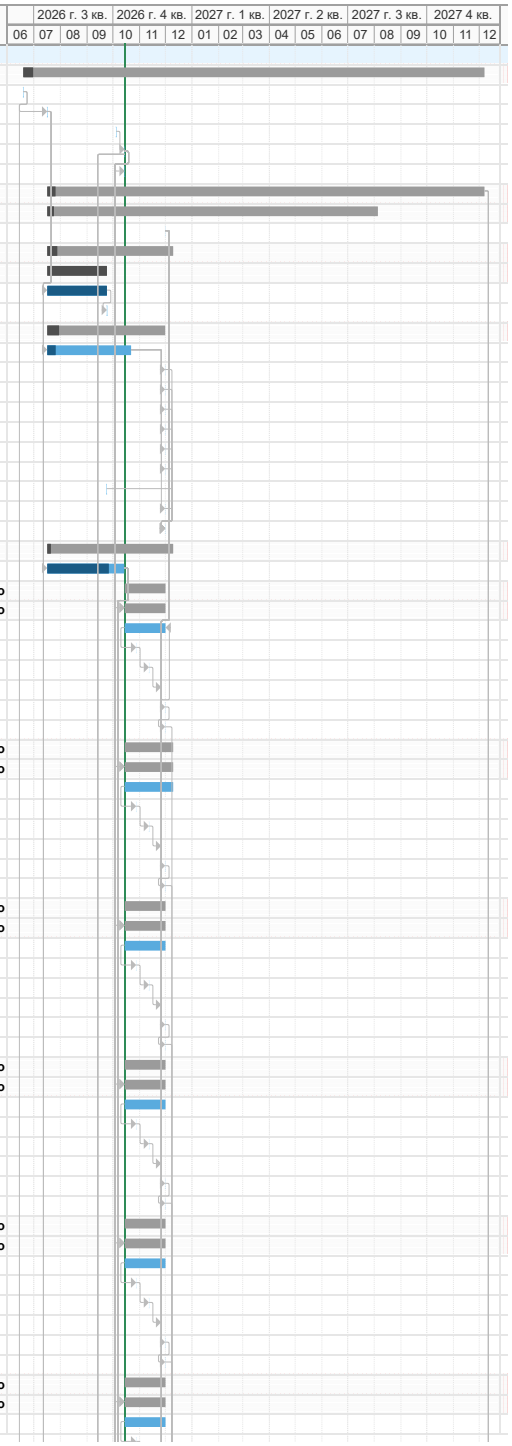


71	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			70НН	Запланировано
72	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			71	Запланировано
73	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			72	Запланировано
74	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
75	ПС установлен в проблемных поселках Гатчинского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			74	Запланировано
76	**Кингисеппский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
77	**Проработка ПС в проблемных поселках Кингисеппского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
78	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Кингисеппск		Запланировано
79	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			78НН	Запланировано
80	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			79	Запланировано
81	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			80	Запланировано
82	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
83	ПС установлен в проблемных поселках Кингисеппского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			82	Запланировано
84	**Киришский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
85	**Проработка ПС в проблемных поселках Киришского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
86	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Киришского р		Запланировано
87	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			86НН	Запланировано
88	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			87	Запланировано
89	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			88	Запланировано
90	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
91	ПС установлен в проблемных поселках Киришского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			90	Запланировано
92	**Лодейнопольский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
93	**Проработка ПС в проблемных поселках Лодейнопольского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
94	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Лодейнополь		Запланировано
95	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			94НН	Запланировано
96	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			95	Запланировано
97	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			96	Запланировано
98	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
99	ПС установлен в проблемных поселках Лодейнопольского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			98	Запланировано
100	**Ломоносовский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
101	**Проработка ПС в проблемных поселках Ломоносовского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
102	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Ломоносовск		Запланировано
103	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			102НН	Запланировано
104	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			103	Запланировано
105	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			104	Запланировано
106	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
107	ПС установлен в проблемных поселках Ломоносовского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			106	Запланировано
108	**Лужский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
109	**Проработка ПС в проблемных поселках Лужского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
110	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Лужского рай		Запланировано
111	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			110НН	Запланировано
112	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			111	Запланировано
113	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			112	Запланировано
114	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
115	ПС установлен в проблемных поселках Лужского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			114	Запланировано
116	**Подпорожский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
117	**Проработка ПС в проблемных поселках Подпорожского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
118	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Подпорожско		Запланировано
119	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			118НН	Запланировано
120	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			119	Запланировано
121	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			120	Запланировано
122	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
123	ПС установлен в проблемных поселках Подпорожского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			122	Запланировано
124	**Приозерский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
125	**Проработка ПС в проблемных поселках Приозерского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
126	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Приозерског		Запланировано
127	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			126НН	Запланировано
128	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			127	Запланировано
129	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			128	Запланировано
130	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
131	ПС установлен в проблемных поселках Приозерского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			130	Запланировано
132	**Сланцевский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
133	**Проработка ПС в проблемных поселках Сланцевского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
134	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Сланцевског		Запланировано
135	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			134НН	Запланировано
136	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			135	Запланировано
137	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			136	Запланировано
138	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10	Запланировано
139	ПС установлен в проблемных поселках Сланцевского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			138	Запланировано
140	**Сосновоборский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**			**Запланировано**
141	**Проработка ПС в проблемных поселках Сосновоборского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**	**Запланировано**
142	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Сосновоборс		Запланировано


143	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			142НН		Запланировано
144	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			143		Запланировано
145	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			144		Запланировано
146	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10		Запланировано
147	ПС установлен в проблемных поселках Сосновоборского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			146		Запланировано
148	**Тихвинский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**				**Запланировано**
149	**Проработка ПС в проблемных поселках Тихвинского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**		**Запланировано**
150	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Тихвинского			Запланировано
151	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			150НН		Запланировано
152	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			151		Запланировано
153	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			152		Запланировано
154	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10		Запланировано
155	ПС установлен в проблемных поселках Тихвинского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			154		Запланировано
156	**Тосненский район**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**				**Запланировано**
157	**Проработка ПС в проблемных поселках Тосненского района**	**Этап**	**15.10.2026**	**01.12.2026**	**33,00**		**27;6**		**Запланировано**
158	Проработка ПС в проблемных поселках района	Проектная задач	15.10.2026	01.12.2026	33,00	Администрация Тосненского			Запланировано
159	ПС установлен в 25% проблемных поселков района	Веха	28.10.2026	28.10.2026			158НН		Запланировано
160	ПС установлен в 50% проблемных поселков района	Веха	12.11.2026	12.11.2026			159		Запланировано
161	ПС установлен в 75% проблемных поселков района	Веха	26.11.2026	26.11.2026			160		Запланировано
162	ПС установлен в 100% проблемных поселков района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			10		Запланировано
163	ПС установлен в проблемных поселках Тосненского района	Веха	01.12.2026	01.12.2026			162		Запланировано
164	ПС установлен во всех проблемных поселках Ленинградской области	Веха	01.12.2026	01.12.2026			115;107;51;35		Запланировано
165	**Признание прав собственности на ЗОПы отсутствующими**	**Этап**	**17.07.2026**	**05.08.2027**	**266,00**			**0,26**	**Выполняется**
166	Подготовка первого иска (КП Norland, Приозерский район)	Проектная задач	17.07.2026	30.10.2026	76,00	Прокуратура Приозерского ра	4	25,00	Выполняется
167	Первый иск подан (КП Norland, Приозерский район)	Веха	30.10.2026	30.10.2026			166		Запланировано
168	**Подготовка и подача исков по всем проблемным поселкам**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
169	**Бокситогорский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
170	**Подготовка исков по проблемным поселкам Бокситогорского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
171	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Бокситогорского	167		Запланировано
172	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			171НН		Запланировано
173	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			172		Запланировано
174	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			173		Запланировано
175	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			174		Запланировано
176	Иски поданы по всем проблемным поселкам Бокситогорского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			170		Запланировано
177	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Бокситогорского	176		Запланировано
178	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			177		Запланировано
179	**Волосовский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
180	**Подготовка исков по проблемным поселкам Волосовского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
181	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Волосовского ра	167		Запланировано
182	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			181НН		Запланировано
183	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			182		Запланировано
184	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			183		Запланировано
185	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			184		Запланировано
186	Иски поданы по всем проблемным поселкам Волосовского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			180		Запланировано
187	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Волосовского ра	186		Запланировано
188	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			187		Запланировано
189	**Волховский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
190	**Подготовка исков по проблемным поселкам Волховского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
191	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Волховского рай	167		Запланировано
192	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			191НН		Запланировано
193	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			192		Запланировано
194	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			193		Запланировано
195	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			194		Запланировано
196	Иски поданы по всем проблемным поселкам Волховского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			190		Запланировано
197	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Волховского рай	196		Запланировано
198	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			197		Запланировано
199	**Всеволожский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
200	**Подготовка исков по проблемным поселкам Всеволожского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
201	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Всеволожского р	167		Запланировано
202	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			201НН		Запланировано
203	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			202		Запланировано
204	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			203		Запланировано
205	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			204		Запланировано
206	Иски поданы по всем проблемным поселкам Всеволожского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			200		Запланировано
207	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Всеволожского р	206		Запланировано
208	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			207		Запланировано
209	**Выборгский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
210	**Подготовка исков по проблемным поселкам Выборгского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
211	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Выборгского рай	167		Запланировано
212	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			211НН		Запланировано
213	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			212		Запланировано
214	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			213		Запланировано

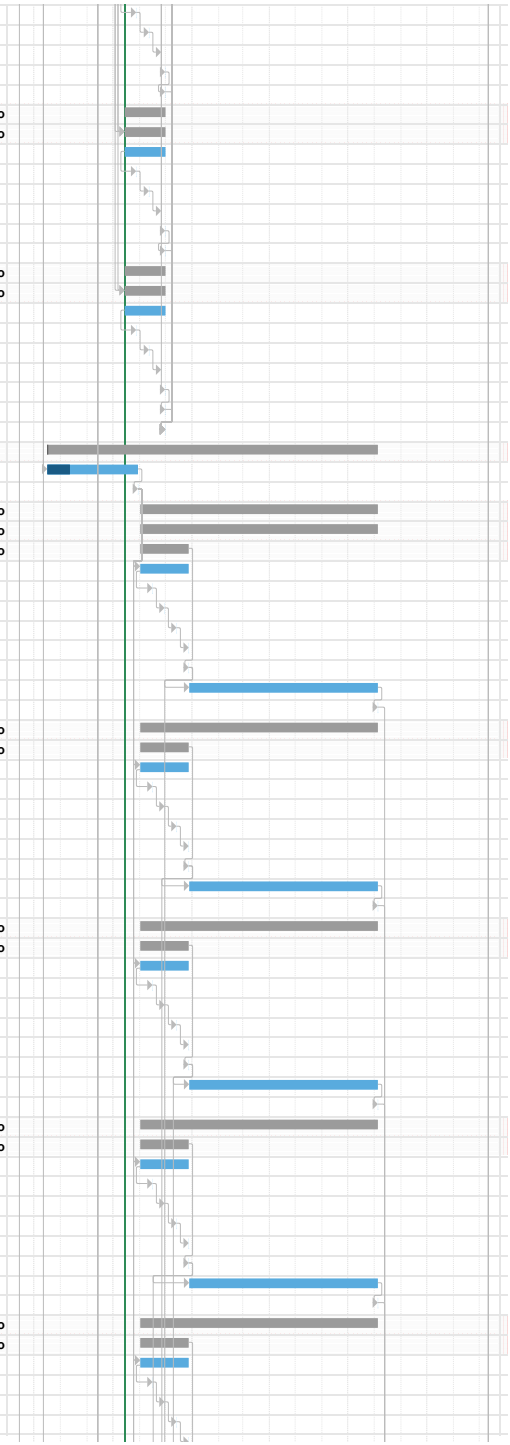

215	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			214	Запланировано
216	Иски поданы по всем проблемным поселкам Выборгского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			210	Запланировано
217	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Выборгского рай	216	Запланировано
218	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			217	Запланировано
219	**Гатчинский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**			**Запланировано**
220	**Подготовка исков по проблемным поселкам Гатчинского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**			**Запланировано**
221	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Гатчинского рай	167	Запланировано
222	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			221НН	Запланировано
223	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			222	Запланировано
224	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			223	Запланировано
225	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			224	Запланировано
226	Иски поданы по всем проблемным поселкам Гатчинского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			220	Запланировано
227	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Гатчинского рай	226	Запланировано
228	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			227	Запланировано
229	**Кингисеппский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**			**Запланировано**
230	**Подготовка исков по проблемным поселкам Кингисеппского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**			**Запланировано**
231	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Кингисеппского	167	Запланировано
232	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			231НН	Запланировано
233	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			232	Запланировано
234	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			233	Запланировано
235	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			234	Запланировано
236	Иски поданы по всем проблемным поселкам Кингисеппского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			230	Запланировано
237	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Кингисеппского	236	Запланировано
238	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			237	Запланировано
239	**Киришский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**			**Запланировано**
240	**Подготовка исков по проблемным поселкам Киришского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**			**Запланировано**
241	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Киришского рай	167	Запланировано
242	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			241НН	Запланировано
243	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			242	Запланировано
244	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			243	Запланировано
245	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			244	Запланировано
246	Иски поданы по всем проблемным поселкам Киришского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			240	Запланировано
247	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Киришского рай	246	Запланировано
248	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			247	Запланировано
249	**Лодейнопольский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**			**Запланировано**
250	**Подготовка исков по проблемным поселкам Лодейнопольского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**			**Запланировано**
251	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Лодейнопольско	167	Запланировано
252	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			251НН	Запланировано
253	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			252	Запланировано
254	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			253	Запланировано
255	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			254	Запланировано
256	Иски поданы по всем проблемным поселкам Лодейнопольского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			250	Запланировано
257	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Лодейнопольско	256	Запланировано
258	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			257	Запланировано
259	**Ломоносовский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**			**Запланировано**
260	**Подготовка исков по проблемным поселкам Ломоносовского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**			**Запланировано**
261	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Ломоносовского	167	Запланировано
262	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			261НН	Запланировано
263	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			262	Запланировано
264	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			263	Запланировано
265	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			264	Запланировано
266	Иски поданы по всем проблемным поселкам Ломоносовского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			260	Запланировано
267	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Ломоносовского	266	Запланировано
268	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			267	Запланировано
269	**Лужский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**			**Запланировано**
270	**Подготовка исков по проблемным поселкам Лужского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**			**Запланировано**
271	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Лужского района	167	Запланировано
272	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			271НН	Запланировано
273	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			272	Запланировано
274	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			273	Запланировано
275	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			274	Запланировано
276	Иски поданы по всем проблемным поселкам Лужского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			270	Запланировано
277	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Лужского района	276	Запланировано
278	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			277	Запланировано
279	**Подпорожский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**			**Запланировано**
280	**Подготовка исков по проблемным поселкам Подпорожского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**			**Запланировано**
281	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Подпорожского	167	Запланировано
282	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			281НН	Запланировано
283	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			282	Запланировано
284	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			283	Запланировано
285	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			284	Запланировано
286	Иски поданы по всем проблемным поселкам Подпорожского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			280	Запланировано

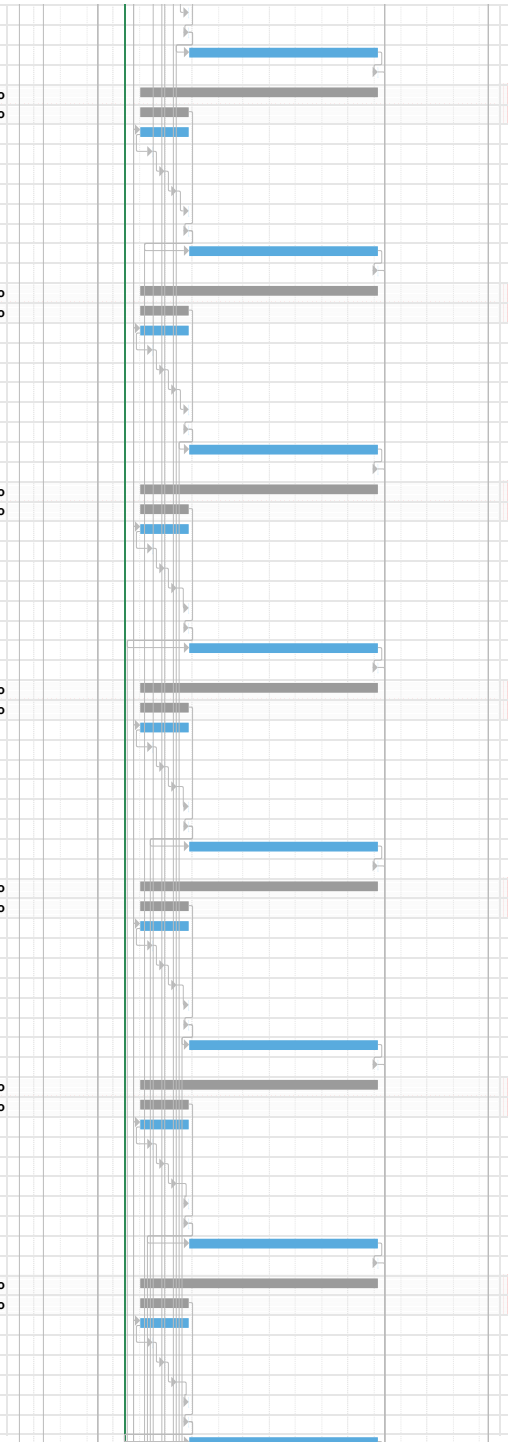

287	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Подпорожского р	286		Запланировано
288	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			287		Запланировано
289	**Приозерский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
290	**Подготовка исков по проблемным поселкам Приозерского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
291	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Приозерского ра	167		Запланировано
292	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			291НН		Запланировано
293	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			292		Запланировано
294	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			293		Запланировано
295	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			294		Запланировано
296	Иски поданы по всем проблемным поселкам Приозерского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			290		Запланировано
297	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Приозерского ра	296		Запланировано
298	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			297		Запланировано
299	**Сланцевский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
300	**Подготовка исков по проблемным поселкам Сланцевского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
301	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Сланцевского ра	167		Запланировано
302	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			301НН		Запланировано
303	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			302		Запланировано
304	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			303		Запланировано
305	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			304		Запланировано
306	Иски поданы по всем проблемным поселкам Сланцевского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			300		Запланировано
307	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Сланцевского ра	306		Запланировано
308	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			307		Запланировано
309	**Сосновоборский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
310	**Подготовка исков по проблемным поселкам Сосновоборского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
311	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Сосновоборског	167		Запланировано
312	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			311НН		Запланировано
313	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			312		Запланировано
314	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			313		Запланировано
315	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			314		Запланировано
316	Иски поданы по всем проблемным поселкам Сосновоборского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			310		Запланировано
317	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Сосновоборског	316		Запланировано
318	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			317		Запланировано
319	**Тихвинский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
320	**Подготовка исков по проблемным поселкам Тихвинского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
321	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Тихвинского рай	167		Запланировано
322	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			321НН		Запланировано
323	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			322		Запланировано
324	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			323		Запланировано
325	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			324		Запланировано
326	Иски поданы по всем проблемным поселкам Тихвинского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			320		Запланировано
327	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Тихвинского рай	326		Запланировано
328	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			327		Запланировано
329	**Тосненский район**	**Этап**	**02.11.2026**	**05.08.2027**	**190,00**				**Запланировано**
330	**Подготовка исков по проблемным поселкам Тосненского района**	**Этап**	**02.11.2026**	**28.12.2026**	**40,00**				**Запланировано**
331	Подготовка и подача исков	Проектная задач	02.11.2026	28.12.2026	40,00	Прокуратура Тосненского рай	167		Запланировано
332	Иски поданы по 25% проблемных поселков района	Веха	16.11.2026	16.11.2026			331НН		Запланировано
333	Иски поданы по 50% проблемных поселков района	Веха	30.11.2026	30.11.2026			332		Запланировано
334	Иски поданы по 75% проблемных поселков района	Веха	14.12.2026	14.12.2026			333		Запланировано
335	Иски поданы по 100% проблемных поселков района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			334		Запланировано
336	Иски поданы по всем проблемным поселкам Тосненского района	Веха	28.12.2026	28.12.2026			330		Запланировано
337	Судебные процессы по поселкам района	Проектная задач	29.12.2026	05.08.2027	150,00	Прокуратура Тосненского рай	336		Запланировано
338	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселк	Веха	05.08.2027	05.08.2027			337		Запланировано
339	Иски поданы по всем поселкам Ленинградской области	Веха	28.12.2026	28.12.2026			216;246;266;3		Запланировано
340	Суды о признании прав собственности на ЗОПы отсутствующим выиграны по всем поселкам Л	Веха	05.08.2027	05.08.2027			278;328;228;2		Запланировано
341	**Другие регионы**	**Этап**	**27.10.2026**	**07.12.2027**	**280,00**				**Запланировано**
342	Работа по другим регионам инициирована (Губернатором ЛО направлены запросу другим Губернатор	Веха	27.10.2026	27.10.2026			349		Запланировано
343	Проведение Круглых столов в регионах	Проектная задач	28.10.2026	25.11.2026	20,00	Губернаторы регионов	342		Запланировано
344	Установление Публичного сервитута (ПС)	Проектная задач	26.11.2026	30.04.2027	104,00	Администрации районов в ре	343		Запланировано
345	Признание прав собственности на ЗОПы отсутствующими	Проектная задач	26.11.2026	07.12.2027	260,00	Прокуратуры регионов	343		Запланировано
346	**Задача 2. Законодательная инициатива уровня РФ**	**Этап**	**17.07.2026**	**09.12.2026**	**103,00**			**55,34**	**Выполняется**
347	Разработка законопроекта	Проектная задач	17.07.2026	29.09.2026	53,00	КУГИ	4	100,00	Завершено
348	Согласование и выверка законопроекта с сообществом пострадавших и экспертами	Проектная задач	30.09.2026	27.10.2026	20,00	КУГИ	347	20,00	Выполняется
349	Законопроект передан в Госдуму	Веха	27.10.2026	27.10.2026			348		Запланировано
350	**Утверждение Законопроекта Госдумой РФ**	**Этап**	**28.10.2026**	**09.12.2026**	**30,00**				**Запланировано**
351	Первое чтение	Проектная задач	28.10.2026	11.11.2026	10,00	Госдума	349		Запланировано
352	Законопроект принят в 1-м чтении	Веха	11.11.2026	11.11.2026			351		Запланировано
353	Второе чтение	Проектная задач	12.11.2026	25.11.2026	10,00	Госдума	352		Запланировано
354	Законопроект принят во 2-м чтении	Веха	25.11.2026	25.11.2026			353		Запланировано
355	Третье чтение	Проектная задач	26.11.2026	09.12.2026	10,00	Госдума	354		Запланировано
356	Законопроект принят в 3-м чтении	Веха	09.12.2026	09.12.2026			355		Запланировано
357	Закон подписан Президентом РФ	Веха	09.12.2026	09.12.2026			356		Запланировано
358	**Управление проектом**	**Этап**	**19.06.2026**	**07.12.2027**	**373,00**				**Запланировано**

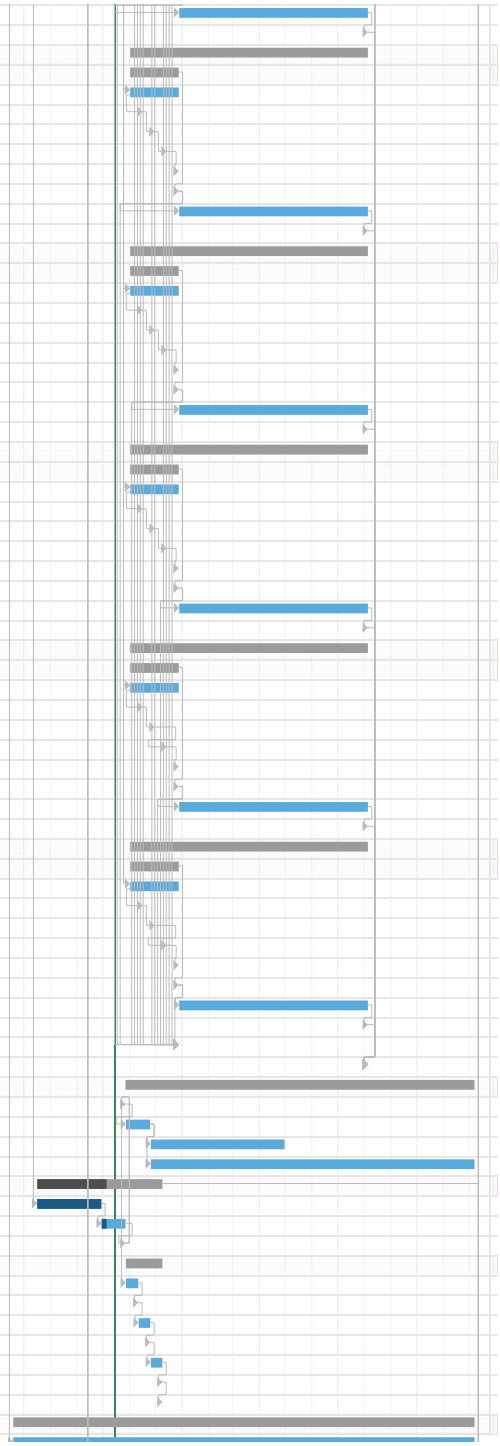

359	Регулярная синхронизация команды сообщества пострадавших	Проектная задач	19.06.2026	07.12.2027	373,00	Сообщество	3	Запланировано	
360	Еженедельные статус-совещания с участием команд (НЕ СТАРТОВАЛИ)	Проектная задач	15.10.2026	07.12.2027	289,00	КУГИ	346ОО;8ОО;6	Запланировано	
361	Ежемесячные статус-совещания с участием Вице-губернатора (НЕ СТАРТОВАЛИ)	Проектная задач	15.10.2026	07.12.2027	289,00	Вице-губернатор ЛО	346ОО;8ОО;6	Запланировано	
362	Ежеквартальные Круглые столы с участием Губернатора ЛО, Депутатов ГД и СФ (НЕ СТАРТОВАЛИ)	Проектная задач	15.10.2026	07.12.2027	289,00	Губернатор ЛО	346ОО;8ОО;6	Запланировано	

